


DIONICE IZVOĐENJA RADOVA



PREGLEDNA SITUACIJA

mjerilo 1:5000

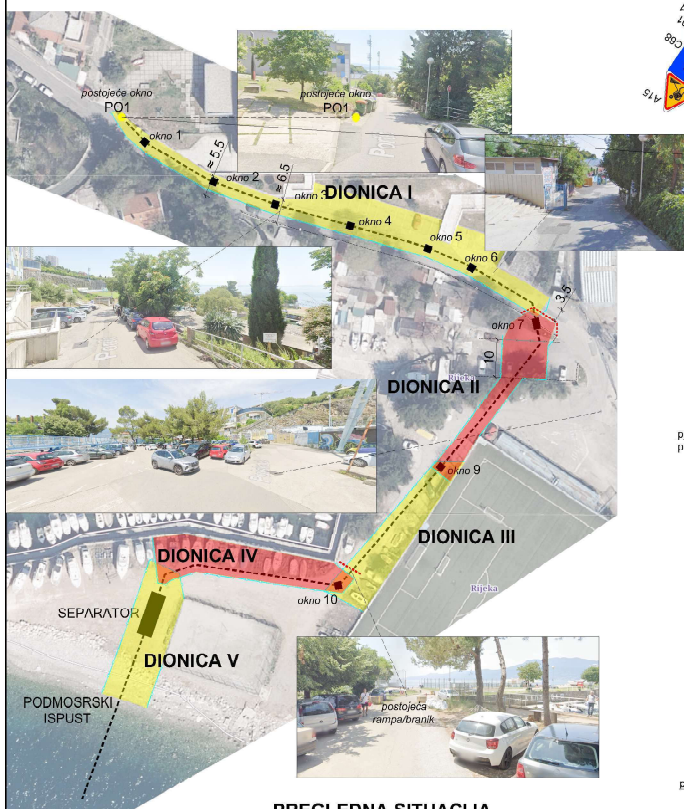

HEME POSTAVLJANJA PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE



Sadržaj dopunske table treba odgovarati stvarnoj dužini ulice slobodne za promet vozila

DIONICA I

Radnici se izvode u segmentima "od ulice do ulice" u dužinama ne većim od 50 m povremenim izmještanjem ograde i branika. Na sivoj strani kolnika je pješački prolaz minimalno širine 2.0 m. Prekop za spoj na postojeće okno izvesti u dane kada se ne vrši pražnjenje otpadnika.



DIONICA II

kolni prolazi omogućuju se uz prethodnu najavu (transport plovila)



DIONICA III

kolni prolazi omogućuju se uz prethodnu najavu (transport plovila)



DIONICA IV

kolni prolazi omogućuju se uz prethodnu najavu (transport plovila)



DIONICA V

za svo vrijeme izvođenja radova



PODMOSRSKI ISPUST

KOMPONENTA A

A9 - podsustav Portić

el. br. 26-21/A2/I/4/1 LIST 1 mjerilo 1:1000
